


12月工程のお知らせ



下記のとおり令和3年12月の予定を計画しましたのでお知らせします。
皆様のご理解ご協力を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。



【施工位置図】

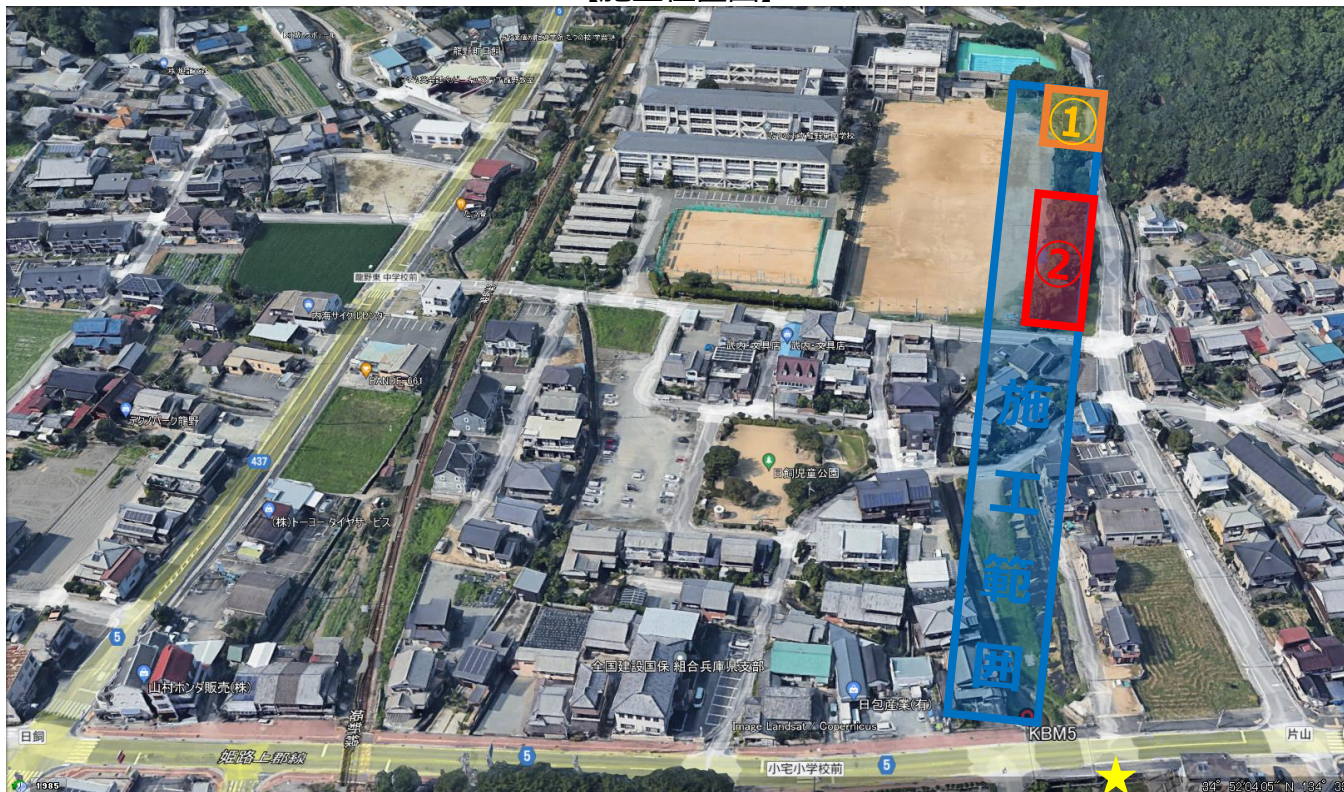

【計画工程表】

↑
現場事務所


月間計画工程表																																	
位置 番号	工 種	種 別	令和3年12月																														
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
			水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金
①	伐採工 (龍野東中学校)	立木伐採 処分																															
②	構造物撤去工	構造物撤去 取壊し																															
②	河川土工 法覆護岸工	掘削・床掘り ブロック積																															
	年末年始休業																																

- 図の青色枠が本工事全体の施工範囲です。現在、中学校周辺の伐採、伐木の集積・処分を行っています。
- 今後は①柿色枠で大木の伐採を行い、②赤色枠で既設護岸の取壊しと護岸工(ブロック積)を行います。
- 年内は残りの伐採を行い、橋上流側の既設護岸の取壊し→河川土工→法覆護岸工へと進めていく予定です。
- 工事車両が現場周辺を頻繁に通行することになりお騒がせします。現場内は立入りをご遠慮くださいますようお願いいたします。
- ご不便をおかけしますが、ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。

裏面へ→

裏面

【作業図】

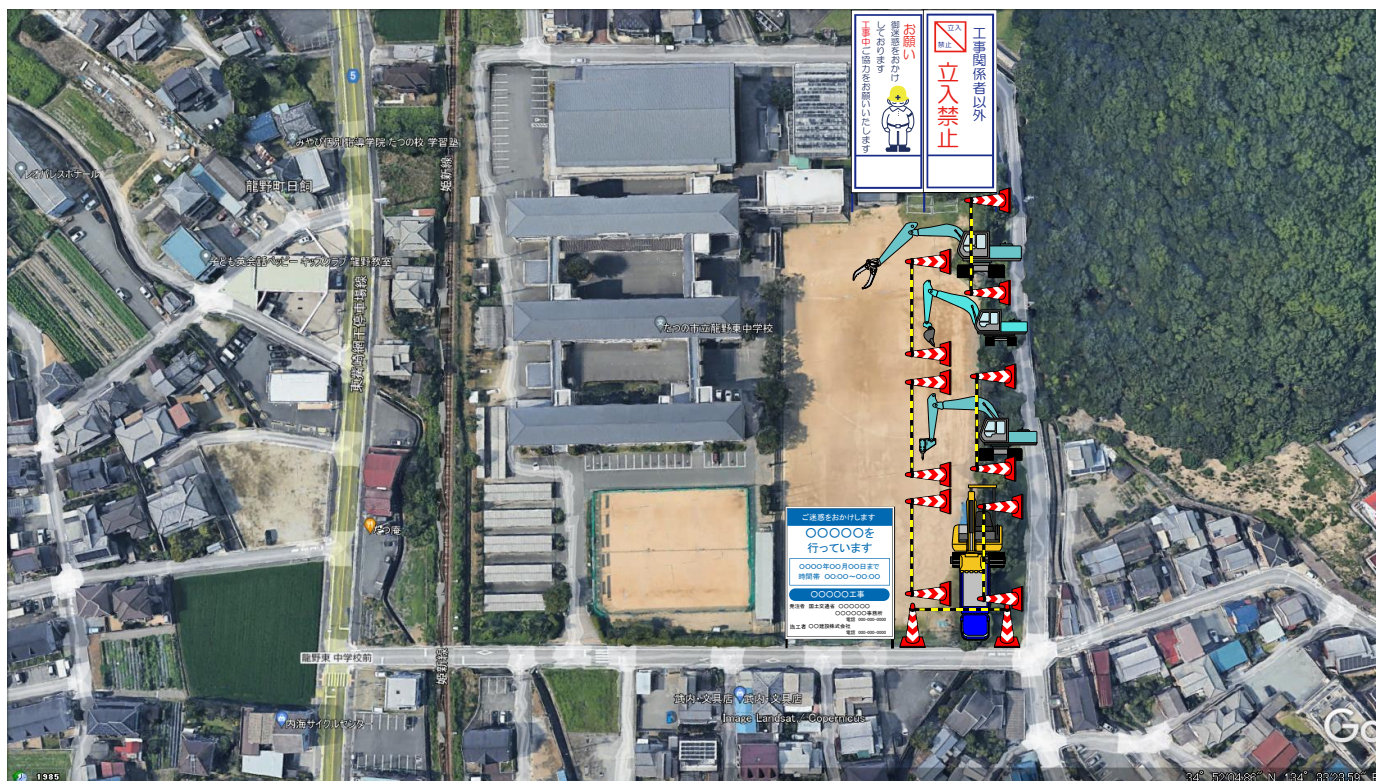

【工事概要、発注者・受注者の連絡先】

工 事 番 号	総流統一般 第2508-0-004号		
工 事 名	(一)揖保川水系山根川 河川改修工事(その3)		
工 期	令和 3 年 11 月 1 日 ～ 令和 4 年 3 月 25 日		※工期延長予定
工 事 場 所	たつの市龍野町片山 地内		
施 工 フ ロ ー	【工 種 概 要】 土工、ブロック積工、平ブロック張工、橋梁上部工、橋梁下部工 【年内の作業】 準備工→伐採工→既設護岸取壊し→河川土工→法覆護岸工		
施 工 業 者	 オリエンタル・テクノ株式会社	TEL 079-322-1071	FAX 079-322-1072
現 場 代 理 人	山崎 道生	携帯 080-6227-4422	
主 任 技 術 者	木下 晃宏	携帯 090-9217-0230	
発 注 者	 兵庫県 西播磨県民局 龍野土木事務所 河川砂防課 岩谷 英樹 TEL 0791-63-5216		

【基本事項】

- 現場周辺道路においては「地元優先・低速運転」を心掛けます。
 - 現場の作業時間については原則、平日(祝祭日を含む)の8時～17時までとさせていただきます。
- ※ 原則週休2日制の工事ですが、作業の進捗及び天候しだいでは土・日も作業を行う場合があります。
