

2月工程のお知らせ



下記のとおり令和4年2月の予定を計画しましたのでお知らせします。
皆様のご理解ご協力を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。



【施工位置図】



【計画工程表】

↑
現場事務所

月間計画工程表

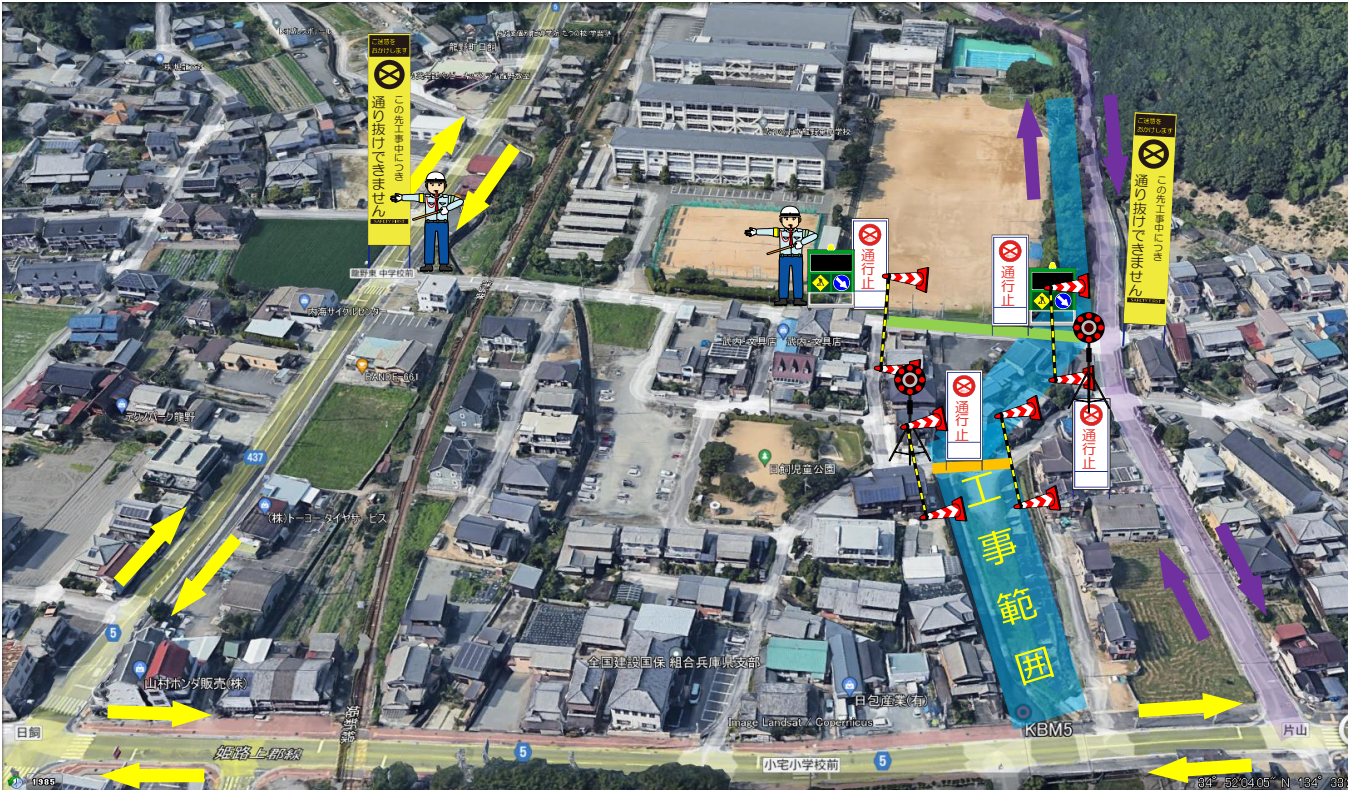
位置 番号	工 種	種 別	令和4年2月																											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
			火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月
①	河川土工 法覆護岸工	掘削・埋戻し 隔壁・基礎 ブロック積																												
②	仮設工 (龍野東中学校)	仮橋 仮通学路整備																												
③	河川土工 法覆護岸工	掘削・床掘り 隔壁・基礎 ブロック積																												
④	構造物撤去工 運搬処理工	構造物取壊し 殻運搬・処分																												

- ①赤色枠内の左岸護岸工(ブロック積)施工後→中学校の仮通学路(水色線)を整備する予定です。
- ①と並行しまして②柿色枠内の土工(掘削)→護岸工(ブロック積)の施工も予定しています。
- 仮通学路が整備できしだい、③黄緑色枠内(片山東中学校線)を通行止めとさせていただきます橋の取壊しを行う予定です。
- 工事車両が現場周辺を頻繁に通行することになりお騒がせします。現場内は立入りをご遠慮くださいますようお願いいたします。
- ご不便をおかけしますが、ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。



裏面へ→

裏面

【迂回路】




【工事概要、発注者・受注者の連絡先】

工事番号	総流統一般 第2508-0-004号		
工事名	(一)揖保川水系山根川 河川改修工事その3		
工期	令和 3 年 11 月 1 日 ~ 令和 4 年 3 月 25 日	※工期延長予定	
工事場所	たつの市龍野町片山 地内		
施工フロー	【工種概要】 土工、ブロック積工、平ブロック張工、橋梁上部工、橋梁下部工 【直近の作業】 河川土工→法覆護岸工(ブロック積)→日飼6号橋取壊し→橋梁下部工		
施工業者	 オリエンタル・テクノ株式会社	TEL 079-322-1071	FAX 079-322-1072
現場代理人	山崎 道生	携帯 080-6227-4422	
監理技術者	木下 晃宏	携帯 090-9217-0230	
発注者	 兵庫県 西播磨県民局 龍野土木事務所 河川砂防課 岩谷 英樹	TEL 0791-63-5216	

【基本事項】

- 現場周辺道路においては「地元優先・低速運転」を心掛けます。
- 現場の作業時間については原則、平日(祝祭日を含む)の8時～17時までとさせていただきます。
※ 原則週休2日制の工事ですが、作業の進捗及び天候次第では土・日も作業を行う場合があります。

【※重要なお知らせ】  ご迷惑をおかけします。 ※通行止め予告看板を設置しております。

- 上図の柿色線「(市)日飼片山線」は2/1(火)から、黄緑色線「(市)片山東中学校線」は2/末頃もしくは3月から、令和4年8月31日(水)までの期間中、全日(24h)全面通行止めとさせていただきます。
- 迂回路 通行止め期間中の迂回ルートについては、上図の黄色線の(主)姫路上郡線のご利用をお願いします。
